		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		**Cajero Automatico**	**40 days**	**15/07/19 08:00 AM**	**6/09/19 05:00 PM**		
2	✔	**Fase 1. Análisis y especificación de requerimientos**	**17 days**	**15/07/19 08:00 AM**	**6/08/19 05:00 PM**		
3	✔	Estudio previo y entrevistas con el cliente.	4 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM		Jefe de Proyecto;Servidor
4	✔	Identificación de requerimientos funcionales	5 days	19/07/19 08:00 AM	25/07/19 05:00 PM	3	Jefe de Proyecto;Servidor
5	✔	Identificación de requerimientos no funcionales	5 days	26/07/19 08:00 AM	1/08/19 05:00 PM	4	Jefe de Proyecto;Servidor
6	✔	Preparación de documentación de especificación	3 days	2/08/19 08:00 AM	6/08/19 05:00 PM	5	Jefe de Proyecto;Servidor
7		Hito 1. Entrega de la especificación de requisitos	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 08:00 AM		
8	✔	**Fase 2. Modelado conceptual**	**4 days**	**7/08/19 08:00 AM**	**12/08/19 05:00 PM**	**6**	
9	✔	Construcción del modelo de objetos	4 days	7/08/19 08:00 AM	12/08/19 05:00 PM	6	Analista;Servidor
10	✔	Especificación de métodos y atributos de clases	4 days	7/08/19 08:00 AM	12/08/19 05:00 PM	6	Analista;Servidor
11	✔	**Fase 3. Diseño**	**5 days**	**12/08/19 05:00 PM**	**19/08/19 05:00 PM**	**8**	
12	✔	Obtención de la arquitectura de la aplicación	4 days	13/08/19 08:00 AM	16/08/19 05:00 PM		Analista;Servidor
13	✔	Diseño y definición de la base de datos	5 days	13/08/19 08:00 AM	19/08/19 05:00 PM		Analista;Servidor
14		Hito 2. Diagrama de clase de UML	0 days	12/08/19 05:00 PM	12/08/19 05:00 PM		
15	✔	**Fase 4. Codificación**	**40 days**	**15/07/19 08:00 AM**	**6/09/19 05:00 PM**		
16	✔	Implementación de la aplicación	40 days	15/07/19 08:00 AM	6/09/19 05:00 PM		Desarrollador;Portatil;Servidor
17		Hito 3. Desarollo de prototipo funcional.	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 08:00 AM		
18		**Fase 5. Pruebas**	**5 days**	**15/07/19 08:00 AM**	**19/07/19 05:00 PM**		
19	✔	Pruebas individuales de clases y sus métodos	5 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM		Tester;Servidor;Impresora
20		Pruebas de integración de los componentes	5 days	15/07/19 08:00 AM	19/07/19 05:00 PM		Tester;Servidor;Impresora
21		Prueba del sistema	4 days	15/07/19 08:00 AM	18/07/19 05:00 PM		Tester;Impresora;Servidor
22		Pruebas de aceptación del clientes	3 days	15/07/19 08:00 AM	17/07/19 05:00 PM		Tester;Servidor;Impresora
23		Hito 4. Entraga final del software	0 days	15/07/19 08:00 AM	15/07/19 08:00 AM		

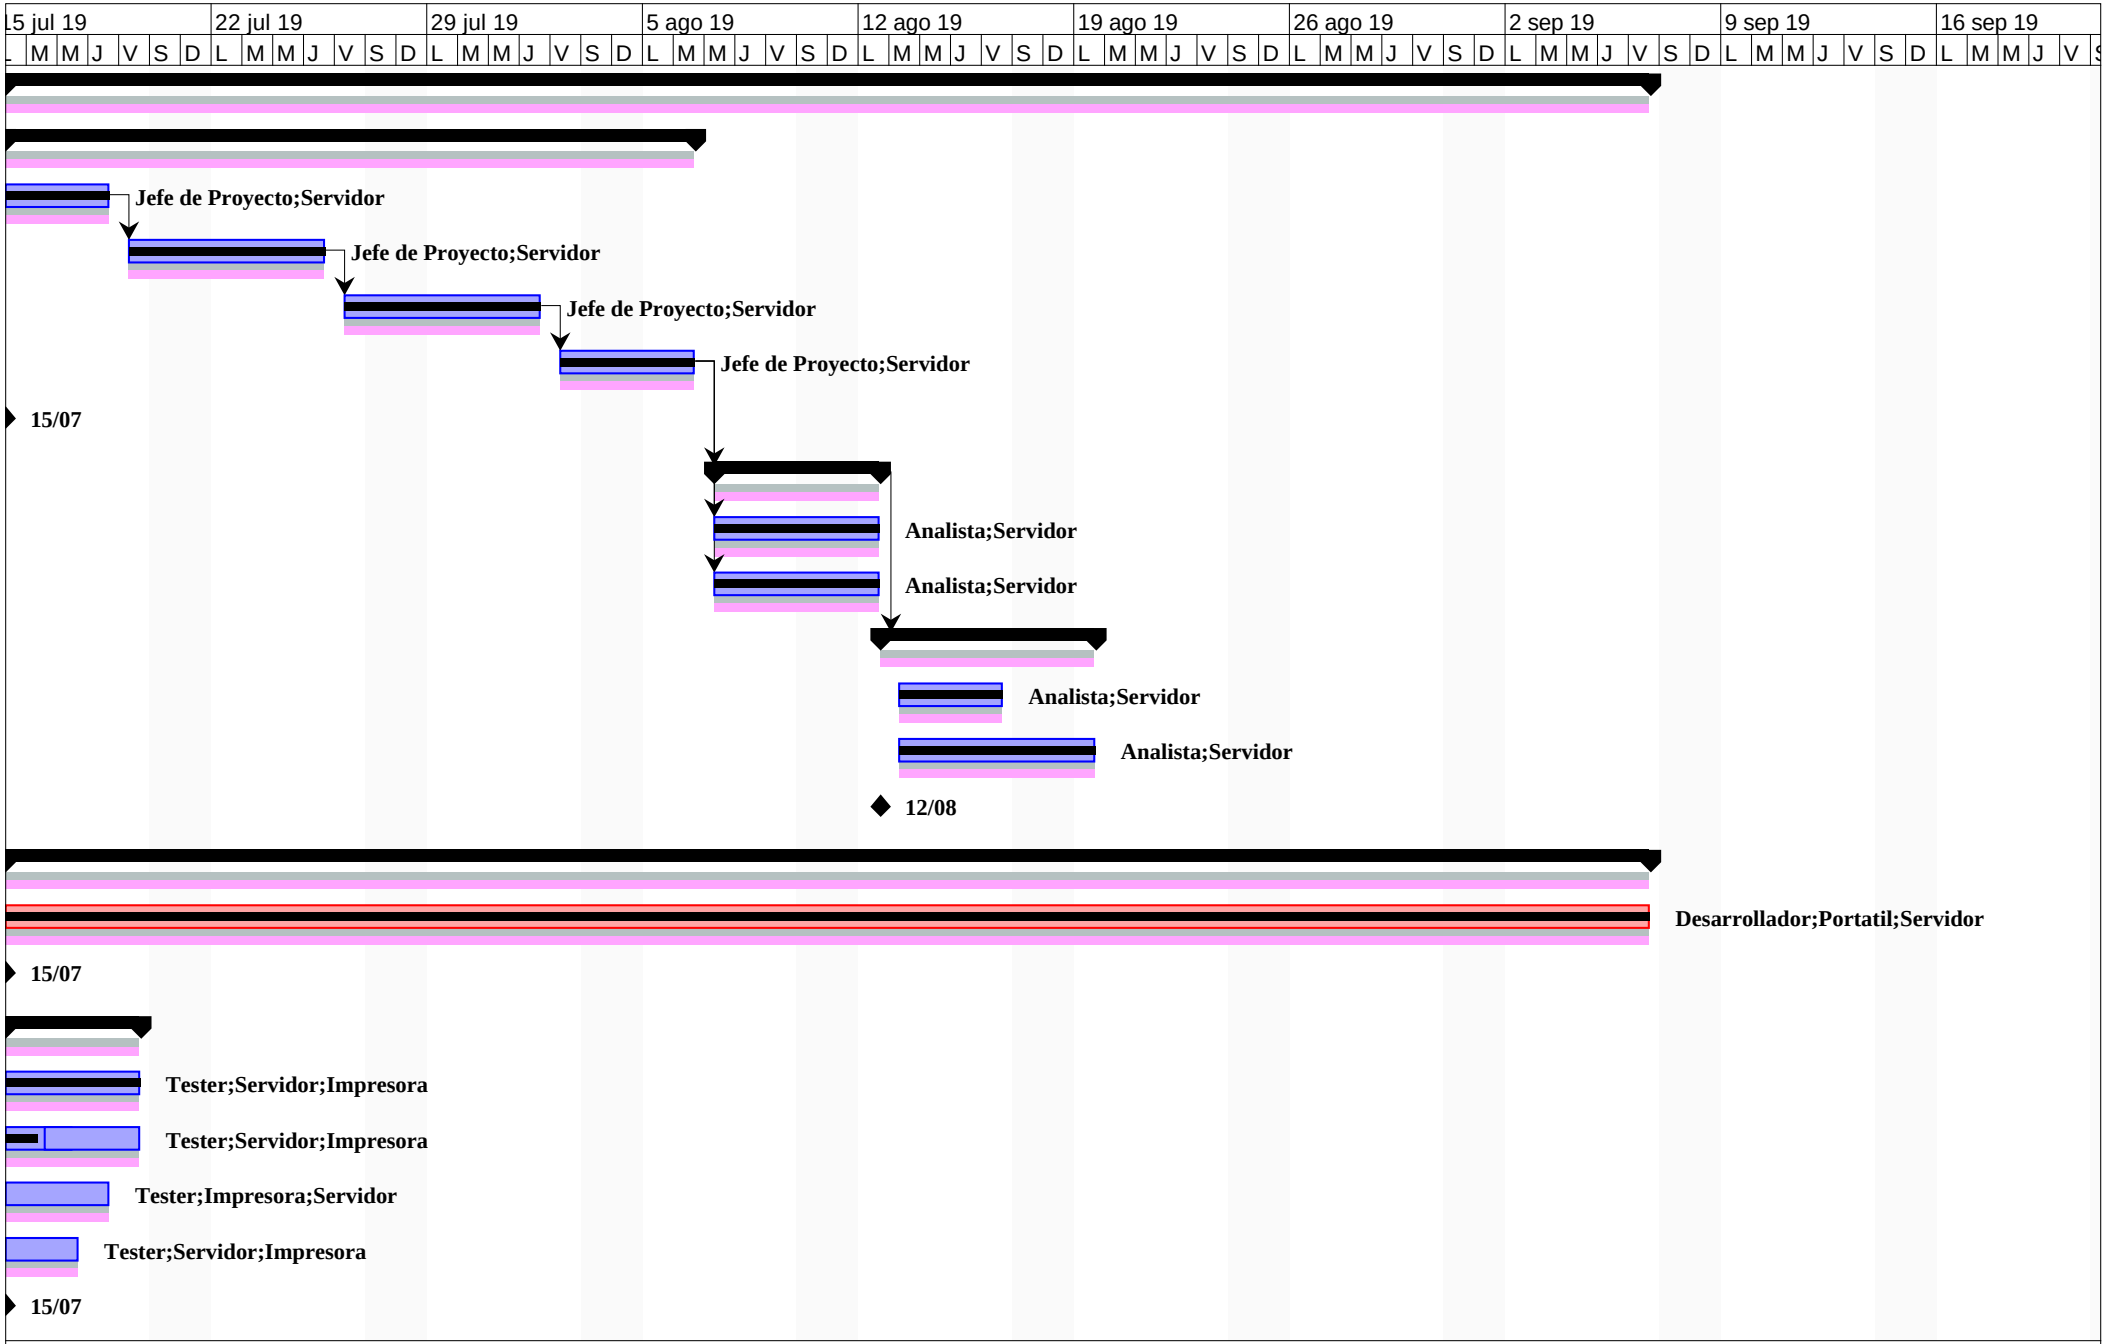
15 jul 19
22 jul 19
29 jul 19
5 ago 19
12 ago 19
19 ago 19
26 ago 19
2 sep 19
9 sep 19
16 sep 19
L M M J V S D
Jefe de Proyecto;Servidor
Jefe de Proyecto;Servidor
Jefe de Proyecto;Servidor
Jefe de Proyecto;Servidor
15/07
Analista;Servidor
Analista;Servidor
Analista;Servidor
Analista;Servidor
12/08
Desarrollador;Portatil;Servidor
15/07
Tester;Servidor;Impresora
Tester;Servidor;Impresora
Tester;Impresora;Servidor
Tester;Servidor;Impresora
15/07

	23 sep 19							30 sep 19						
S D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
